# COMPLEXE CULTUREL FÉLIX-LECLERC

**MISE À NIVEAU** 



GUILLAUME DONTIGNY, ING. MBA DIRECTEUR DU SERVICE TECHNIQUE

ESPECIAL DELICATION

#### AN DE LA RESENTATION Sommaire du projet • Salle La Forestière Espace Carole Guérin Budget au 2 mars 2021 Échéancier révisé

#### SOMMAIRE DU PROJET

#### SALLE LA FORESTIÈRE


Le projet comprend la modernisation et la mise aux normes incluant :

- le remplacement des sièges et du gradin télescopique;
- la reconfiguration de l'espace de régie au balcon;
- l'aménagement d'espaces de soutien (cuisinette) derrière la salle;
- le remplacement et la mise à niveau des équipements techniques de scène.

De plus, de nouveaux espaces de rangement seront ajoutés au-dessus des espaces actuels d'entreposage en arrière-scène. La circuiterie électrique sera revue de même que la circuiterie d'interconnexion. Des modifications seront apportées aux perches d'accrochage. Un manteau de scène sera ajouté et les rideaux de scène seront remplacés. Le revêtement du plancher de la scène sera refait à neuf, des caniveaux avec circuiterie électrique et d'interconnexion seront ajoutés au plancher de la scène en remplacement des anciennes trappes encastrées.


### SALLE LA FORESTIÈRE

AVANT 530 PLACES

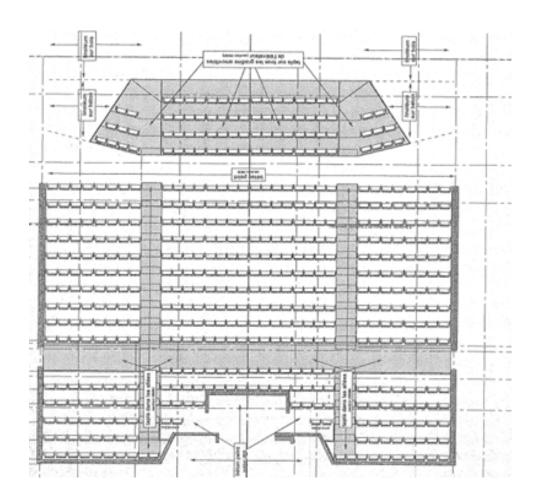

#### SALLE LA FORESTIÈRE

APRÈS 486 PLACES

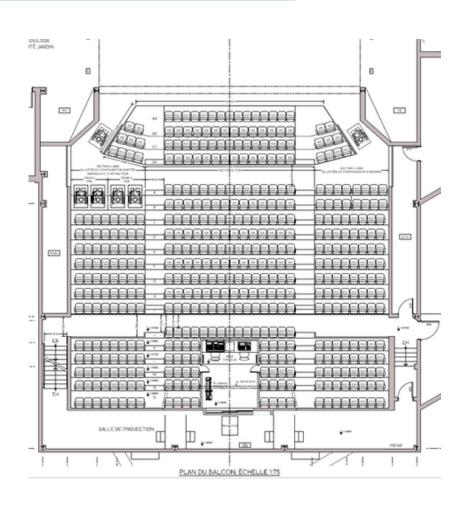


#### SOMMAIRE DU PROJET

#### **ESPACE CAROLE GUÉRIN (FOYER)**

Dans le foyer, une scène à configuration variable sera aménagée pour recevoir de plus petites prestations ainsi que des évènements de type banquet (150 à 228 personnes).


### ESPACE CAROLE GUÉRIN

configuration x
228
PLACES

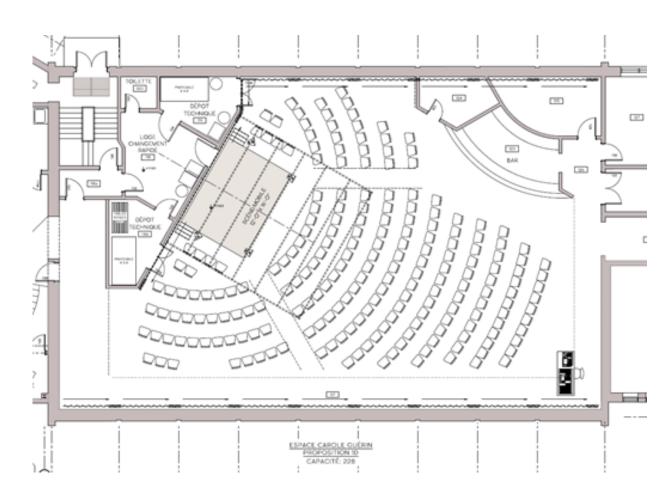

### ESPACE CAROLE GUÉRIN

configuration y
150
PLACES

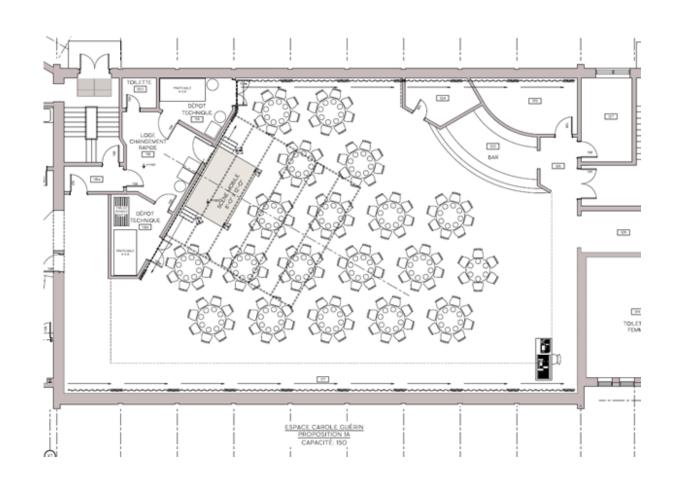

#### BUDGET AU 2 MARS 2021

#### LE PROJET TOTALISE MAINTENANT 3.94 M\$

- contrairement à septembre 2020, nous avons maintenant la possibilité d'emprunter le montant total du projet;
- la contribution provinciale est de 70 %, soit 2.78 M\$;
- la contribution fédérale est de 644 600 \$;
- le fonds Hydro-Québec est utilisé pour 352 679 \$;
- contribution possible d'un partenaire pour la somme de 160 000 \$.

#### Aucune taxation supplémentaire pour le citoyen!

### ECHEANCIER REVISE

2 MARS 2021

15 MARS 2021 15 JUILLET 2021

**SEPTEMBRE 2021** 

Adjudication

Début du chantier

Livraison provisoire Acceptation finale

**Programmation** 

## PÉRIODE DE QUESTIONS
